

## 令和2年度 東部管内建設発生土に関する調整会議(第2回)

日 時:令和3年3月10日(水)10:00～

場 所:鳥取県東部庁舎5階 講堂

出席者:(公財)鳥取県建設技術センター

国土交通省 鳥取河川国道事務所

鳥取市 都市整備部 都市企画課

水道局

岩美町 産業建設課

鳥取県 地域づくり推進部 文化財局

東部建築住宅事務所

東部農林事務所 地域整備課

県土整備部 技術企画課

鳥取港湾事務所

八頭県土整備事務所(計画調査室)

鳥取県土整備事務所(各事業課・室)

### 1 あいさつ

### 2 議 題

1)令和3年度以降の建設発生土の発生予定について…資料1

2)(公財)鳥取県建設技術センター事業所の建設発生土受入状況について…資料2

3)民間残土受入地の受入状況について…資料3、資料4

4)青谷上寺地遺跡整備事業への建設発生土の搬出について…資料5、資料6

### 3 その他

## 【東部・八頭管内】建設発生土量・受入可能量集計表

### ●鳥取県土整備事務所管内(直轄を除く)

(単位:m3)

| 機関名              | 建設発生土(土量、発生時期) |               |               |               |                |               |               | 不足土(土量、発生時期) |               |              |               |               |               |               |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | 4~6月           | 7~9月          | 10~12月        | 1~3月          | 計              | R4想定          | R5想定          | 4~6月         | 7~9月          | 10~12月       | 1~3月          | 計             | R4想定          | R5想定          |
| <b>鳥取県土整備事務所</b> | <b>10,440</b>  | <b>29,160</b> | <b>35,590</b> | <b>20,880</b> | <b>96,070</b>  | <b>39,400</b> | <b>30,650</b> | <b>1,520</b> | <b>5,460</b>  | <b>250</b>   | <b>10,150</b> | <b>17,380</b> | <b>43,000</b> | <b>12,000</b> |
| 道路都市課            | 4,200          | 9,150         | 7,700         | 3,800         | 24,850         | -             | -             | -            | -             | -            | -             | -             | -             | -             |
| 河川砂防課            | 6,240          | 11,540        | 8,990         | 980           | 27,750         | 27,100        | 22,450        | 1,500        | 5,460         | 250          | 150           | 7,360         | 13,000        | 12,000        |
| 山陰道・岩美道路推進室      | -              | 300           | -             | -             | 300            | -             | -             | -            | -             | -            | 10,000        | 10,000        | 30,000        | -             |
| 計画調査課            | -              | 8,170         | -             | -             | 8,170          | -             | -             | 20           | -             | -            | -             | 20            | -             | -             |
| 維持管理課            | -              | -             | 18,900        | 16,100        | 35,000         | 12,300        | 8,200         | -            | -             | -            | -             | -             | -             | -             |
| <b>東部農林事務所</b>   | -              | -             | -             | -             | -              | -             | -             | <b>2,500</b> | <b>7,100</b>  | <b>1,200</b> | <b>800</b>    | <b>11,600</b> | -             | -             |
| <b>鳥取市</b>       | <b>767</b>     | <b>2,288</b>  | <b>2,007</b>  | <b>1,336</b>  | <b>6,398</b>   | <b>5,565</b>  | <b>1,550</b>  | <b>730</b>   | <b>1,589</b>  | <b>1,582</b> | <b>210</b>    | <b>4,111</b>  | <b>530</b>    | -             |
| <b>鳥取市水道局</b>    | <b>147</b>     | <b>3,140</b>  | <b>3,468</b>  | <b>830</b>    | <b>7,585</b>   | -             | -             | <b>62</b>    | <b>170</b>    | <b>112</b>   | -             | <b>344</b>    | -             | -             |
| <b>計</b>         | <b>11,354</b>  | <b>34,588</b> | <b>41,065</b> | <b>23,046</b> | <b>110,053</b> | <b>44,965</b> | <b>32,200</b> | <b>4,812</b> | <b>14,319</b> | <b>3,144</b> | <b>11,160</b> | <b>33,435</b> | <b>43,530</b> | <b>12,000</b> |
| 差引               | 6,542          | 20,269        | 37,921        | 11,886        | 76,618         | 1,435         | 20,200        |              |               |              |               |               |               |               |

### ●八頭県土整備事務所管内(直轄を除く)

(単位:m3)

| 機関名              | 建設発生土(土量、発生時期) |               |              |              |               |               |               | 不足土(土量、発生時期) |            |              |            |              |      |      |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------|------|
|                  | 4~6月           | 7~9月          | 10~12月       | 1~3月         | 計             | R4想定          | R5想定          | 4~6月         | 7~9月       | 10~12月       | 1~3月       | 計            | R4想定 | R5想定 |
| <b>八頭県土整備事務所</b> | <b>23,540</b>  | <b>16,480</b> | <b>9,800</b> | <b>3,500</b> | <b>53,320</b> | <b>16,950</b> | <b>11,770</b> | <b>500</b>   | <b>610</b> | <b>3,000</b> | <b>500</b> | <b>4,610</b> | -    | -    |
| 道路整備課            | 1,700          | 1,680         | 600          | -            | 3,980         | -             | -             | -            | 110        | 3,000        | 500        | 3,610        | -    | -    |
| 河川砂防課            | 9,840          | 1,800         | 2,700        | -            | 14,340        | 16,950        | 11,770        | 500          | 500        | -            | -          | 1,000        | -    | -    |
| 維持管理課            | 12,000         | 13,000        | 6,500        | 3,500        | 35,000        | -             | -             | -            | -          | -            | -          | -            | -    | -    |
| <b>計</b>         | <b>23,540</b>  | <b>16,480</b> | <b>9,800</b> | <b>3,500</b> | <b>53,320</b> | <b>16,950</b> | <b>11,770</b> | <b>500</b>   | <b>610</b> | <b>3,000</b> | <b>500</b> | <b>4,610</b> | -    | -    |
| 差引               | 23,040         | 15,870        | 6,800        | 3,000        | 48,710        | 16,950        | 11,770        |              |            |              |            |              |      |      |

### ●鳥取河川国道事務所

(単位:m3)

| 機関名              | 建設発生土(土量、発生時期) |               |              |      |               |      |      | 不足土(土量、発生時期) |            |        |      |            |      |      |
|------------------|----------------|---------------|--------------|------|---------------|------|------|--------------|------------|--------|------|------------|------|------|
|                  | 4~6月           | 7~9月          | 10~12月       | 1~3月 | 計             | R4想定 | R5想定 | 4~6月         | 7~9月       | 10~12月 | 1~3月 | 計          | R4想定 | R5想定 |
| <b>鳥取河川国道事務所</b> | <b>5,100</b>   | <b>17,600</b> | <b>8,000</b> | -    | <b>30,700</b> | -    | -    | <b>200</b>   | <b>100</b> | -      | -    | <b>300</b> | -    | -    |
| <b>計</b>         | <b>5,100</b>   | <b>17,600</b> | <b>8,000</b> | -    | <b>30,700</b> | -    | -    | <b>200</b>   | <b>100</b> | -      | -    | <b>300</b> | -    | -    |
| 差引               | 4,900          | 17,500        | 8,000        | -    | 30,400        | -    | -    |              |            |        |      |            |      |      |

### <土量収支結果>

(単位:m3)

| 総計 | 4~6月   | 7~9月   | 10~12月 | 1~3月   | 計       | R4想定   | R5想定   |
|----|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|    | 34,482 | 53,639 | 52,721 | 14,886 | 155,728 | 18,385 | 31,970 |

## 【東部・八頭管内】建設発生土量の行き先

### ●鳥取県土整備事務所管内(直轄を除く)

(単位:m3)

| 機関名              |             | 建設発生土(土量、発生時期) |               |               |               |                |               |               |
|------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                  |             | 4~6月           | 7~9月          | 10~12月        | 1~3月          | 計              | R4想定          | R5想定          |
| <b>鳥取県土整備事務所</b> |             | <b>10,440</b>  | <b>29,160</b> | <b>35,590</b> | <b>20,880</b> | <b>96,070</b>  | <b>39,400</b> | <b>30,650</b> |
|                  | 道路都市課       | 4,200          | 9,150         | 7,700         | 3,800         | 24,850         | -             | -             |
|                  | 河川砂防課       | 6,240          | 11,540        | 8,990         | 980           | 27,750         | 27,100        | 22,450        |
|                  | 山陰道・岩美道路推進室 | -              | 300           | -             | -             | 300            | -             | -             |
|                  | 計画調査課       | -              | 8,170         | -             | -             | 8,170          | -             | -             |
|                  | 維持管理課       | -              | -             | 18,900        | 16,100        | 35,000         | 12,300        | 8,200         |
| <b>東部農林事務所</b>   |             | -              | -             | -             | -             | -              | -             | -             |
| <b>鳥取市</b>       |             | <b>767</b>     | <b>2,288</b>  | <b>2,007</b>  | <b>1,336</b>  | <b>6,398</b>   | <b>5,565</b>  | <b>1,550</b>  |
| <b>鳥取市水道局</b>    |             | <b>147</b>     | <b>3,140</b>  | <b>3,468</b>  | <b>830</b>    | <b>7,585</b>   | -             | -             |
| <b>計</b>         |             | <b>11,354</b>  | <b>34,588</b> | <b>41,065</b> | <b>23,046</b> | <b>110,053</b> | <b>44,965</b> | <b>32,200</b> |
| 処分先<br>内訳        | センター        | -              | -             | -             | -             | -              | -             | -             |
|                  | 民間          | 7,699          | 19,223        | 37,915        | 23,046        | 87,883         | 44,965        | 32,200        |
|                  | その他         | 3,655          | 15,365        | 3,150         | -             | 22,170         | -             | -             |

### ●八頭県土整備事務所管内(直轄を除く)

(単位:m3)

| 機関名              |       | 建設発生土(土量、発生時期) |               |              |              |               |               |               |
|------------------|-------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |       | 4~6月           | 7~9月          | 10~12月       | 1~3月         | 計             | R4想定          | R5想定          |
| <b>八頭県土整備事務所</b> |       | <b>23,540</b>  | <b>16,480</b> | <b>9,800</b> | <b>3,500</b> | <b>53,320</b> | <b>16,950</b> | <b>11,770</b> |
|                  | 道路整備課 | 1,700          | 1,680         | 600          | -            | 3,980         | -             | -             |
|                  | 河川砂防課 | 9,840          | 1,800         | 2,700        | -            | 14,340        | 16,950        | 11,770        |
|                  | 計画調査課 | -              | -             | -            | -            | -             | -             | -             |
|                  | 維持管理課 | 12,000         | 13,000        | 6,500        | 3,500        | 35,000        | -             | -             |
| <b>計</b>         |       | <b>23,540</b>  | <b>16,480</b> | <b>9,800</b> | <b>3,500</b> | <b>53,320</b> | <b>16,950</b> | <b>11,770</b> |
| 処分先<br>内訳        | センター  | -              | -             | -            | -            | -             | -             | -             |
|                  | 民間    | 23,540         | 16,480        | 9,800        | 3,500        | 53,320        | 16,950        | 11,770        |
|                  | その他   | -              | -             | -            | -            | -             | -             | -             |

### ●鳥取河川国道事務所

(単位:m3)

| 機関名              |      | 建設発生土(土量、発生時期) |               |              |      |               |      |      |
|------------------|------|----------------|---------------|--------------|------|---------------|------|------|
|                  |      | 4~6月           | 7~9月          | 10~12月       | 1~3月 | 計             | R4想定 | R5想定 |
| <b>鳥取河川国道事務所</b> |      | <b>5,100</b>   | <b>17,600</b> | <b>8,000</b> | -    | <b>30,700</b> | -    | -    |
| <b>計</b>         |      | <b>5,100</b>   | <b>17,600</b> | <b>8,000</b> | -    | <b>30,700</b> | -    | -    |
| 処分先<br>内訳        | センター | -              | -             | -            | -    | -             | -    | -    |
|                  | 民間   | 4,100          | 15,600        | 6,000        | -    | 25,700        | -    | -    |
|                  | その他  | 1,000          | 2,000         | 2,000        | -    | 5,000         | -    | -    |

### <集計>

(単位:m3)

|           |      | 4~6月          | 7~9月          | 10~12月        | 1~3月          | 計              | R4想定          | R5想定          |
|-----------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 処分先<br>内訳 | センター | -             | -             | -             | -             | -              | -             | -             |
|           | 民間   | 35,339        | 51,303        | 53,715        | 26,546        | 166,903        | 61,915        | 43,970        |
|           | その他  | 4,655         | 17,365        | 5,150         | -             | 27,170         | -             | -             |
| <b>総計</b> |      | <b>39,994</b> | <b>68,668</b> | <b>58,865</b> | <b>26,546</b> | <b>194,073</b> | <b>61,915</b> | <b>43,970</b> |







令和3年度以降の建設発生土量 調査票【東部・八頭管内】

鳥取県土整備事務所管内(直轄を除く)

(単位:m3)

| 機関名     | 整理番号 | 予算区分 | 課名         | 工事名                        | 工事場所        | 建設発生土(土量、発生時期) |      |      |      |        |      |     |                          |       |      | 不足土(土量、発生時期) |      |      |        |       |     |     |       |                               |  |     |  |  |
|---------|------|------|------------|----------------------------|-------------|----------------|------|------|------|--------|------|-----|--------------------------|-------|------|--------------|------|------|--------|-------|-----|-----|-------|-------------------------------|--|-----|--|--|
|         |      |      |            |                            |             | 処分先            | 土質区分 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 計   | 備考                       | R4想定  | R5想定 | 土質区分         | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月  | 計   | 備考  | R4想定  | R5想定                          |  |     |  |  |
| 東部農林事務所 | 6    | 明許   | 地域整備課      | 山上地区ほ場整備(山上1工区)工事          | 八頭郡八頭町山上    |                |      |      |      |        |      |     |                          |       |      |              |      | 4    |        | 2,700 |     |     | 2,700 | 水田基盤土(礫、転石を含まない土)             |  |     |  |  |
| 東部農林事務所 | 7    | 明許   | 地域整備課      | 山上地区ほ場整備(山上1工区)工事          | 八頭郡八頭町山上    |                |      |      |      |        |      |     |                          |       |      |              |      | 4    | 300    | 300   | 300 | 300 | 1,200 | 水田表土                          |  |     |  |  |
| 東部農林事務所 | 8    | 現年   | 地域整備課      | 山根地区ほ場整備(3工区)工事            | 鳥取市青谷町山根    |                |      |      |      |        |      |     |                          |       |      |              |      | 4    |        | 100   | 400 |     | 500   | 水田基盤土(礫、転石を含まない土)             |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 1    | 現年   | 道路課        | 市道弥生橋通り電線類地中化工事(交付金)       | 鳥取市寺町       | 民間             | B    |      |      | 50     | 50   | 100 |                          |       |      |              |      |      |        |       |     |     |       |                               |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 2    | 現年   | 道路課        | 市道中郷2号線道路改良工事(交付金)         | 鳥取市国府町中郷    | 民間             | B    |      |      |        |      | 50  | 50                       |       |      |              |      |      |        |       |     |     |       |                               |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 3    | 現年   | 都市環境課      | 内海川ほか河川浚渫業務                | 内海中ほか       | 民間             | F    |      | 250  | 250    |      | 500 | レキ、浚渫土(シルト交じり砂)          | 500   | 500  |              |      |      |        |       |     |     |       |                               |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 4    | 現年   | 都市環境課      | 猪子川ほか河川浚渫業務                | 猪子ほか        | 民間             | F    |      |      | 250    | 250  | 500 | レキ、浚渫土(シルト交じり砂)          | 500   | 500  |              |      |      |        |       |     |     |       |                               |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 5    | 現年   | 都市環境課      | 内海川改良工事                    | 内海中ほか       | 民間             | B    |      |      | 100    | 400  | 500 |                          |       |      |              |      |      |        |       |     |     |       |                               |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 6    | 現年   | 都市環境課      | 宮の谷川改良工事                   | 越路          | 民間             | B    |      |      |        |      | 20  | 20                       |       |      |              |      |      |        |       |     |     |       |                               |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 7    | 明許   | 南工事事務所     | 市道布袋工業団地3号線道路整備工事          | 鳥取市河原町布袋地内  |                |      |      |      |        |      |     |                          |       |      |              |      | 1    | 500    | 1,000 | 700 |     | 2,200 |                               |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 8    | 明許   | 南工事事務所     | 令和2年災佐治町つく谷地区災害復旧工事(2-204) | 鳥取市佐治町つく谷地内 |                |      |      |      |        |      |     |                          |       |      |              |      | 2    |        |       | 50  | 20  | 70    |                               |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 9    | 現年   | 南工事事務所     | 散岐保育園駐車場整備工事               | 鳥取市河原町佐貫地内  | 民間             | A    | 30   | 40   |        |      | 70  |                          |       |      |              |      |      |        |       |     |     |       |                               |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 10   | 明許   | 南工事事務所     | 令和2年災第16号曳田川河川災害復旧工事       | 鳥取市河原町北村地内  | 民間             | A    |      |      |        |      | 480 | 480                      |       |      |              |      | 2    |        |       | 480 |     | 480   | 流用「令和2年災河原町北村地区災害復旧工事(2-207)」 |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 11   | 現年   | 南工事事務所     | 市道南岸線道路改良工事(交付金)           | 鳥取市佐治町大井地内  | 民間             | A    |      |      | 530    |      | 530 |                          |       |      |              |      | 1    |        |       | 190 | 190 | 380   |                               |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 12   | 明許   | 南工事事務所     | 令和2年災河原町北村地区災害復旧工事(2-207)  | 鳥取市河原町北村地内  | その他            | A    | 180  |      |        |      | 180 | 流用「令和2年災第16号曳田川河川災害復旧工事」 | 2     | 180  |              |      |      |        |       |     |     | 180   |                               |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 13   | 現年   | 鳥取西地域工事事務所 | 単県斜面崩壊復旧事業(青谷町露谷地区)        | 鳥取市青谷町露谷    | 民間             | A    |      | 170  |        |      | 170 | 上寺地遺跡整備事業受入協議            |       |      |              |      |      |        |       |     |     |       |                               |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 14   | 明許   | 鳥取西地域工事事務所 | 市道下善田露谷線ほか道路改良工事           | 鳥取市青谷町善田    | 民間             | B,C  | 50   | 150  |        |      | 200 | 〃                        | 300   |      |              |      |      | 50     | 100   |     |     | 150   |                               |  | 300 |  |  |
| 鳥取市     | 15   | 現年   | 鳥取西地域工事事務所 | 市道日光浜村線道路改良工事              | 鳥取市気高町浜村    | 民間             | B    |      | 25   |        |      | 25  | 〃                        | 30    |      |              |      |      |        | 25    |     |     | 25    |                               |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 16   | 現年   | 鳥取西地域工事事務所 | 市道亀尻山田線道路改良工事              | 鳥取市青谷町亀尻    | 民間             | B    |      | 70   |        |      | 70  | 〃                        | 85    |      |              |      |      |        | 70    |     |     | 70    |                               |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 17   | 現年   | 鳥取西地域工事事務所 | 日光川河川改良工事                  | 鳥取市気高町日光    | 民間             | B    |      |      | 150    |      | 150 | 〃                        |       |      |              |      |      |        |       | 100 |     | 100   |                               |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 18   | 現年   | 鳥取西地域工事事務所 | 単県斜面崩壊復旧工事(気高町宝木地区)        | 鳥取市気高町宝木    | 民間             | B    |      | 100  |        |      | 100 | 〃                        |       |      |              |      |      |        |       |     |     |       |                               |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 19   |      | 鳥取西地域工事事務所 | 市道早牛勝部線道路改良工事              | 鳥取市青谷町八葉寺   | 民間             | C,D  |      |      |        |      |     |                          | 3,500 |      |              |      |      |        |       |     |     |       |                               |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 20   |      | 鳥取西地域工事事務所 | 小規模急傾斜地崩壊対策工事(気高町土居地区)     | 鳥取市気高町土居    | 民間             | A    |      |      |        |      |     |                          | 100   |      |              |      |      |        |       |     |     |       |                               |  | 100 |  |  |
| 鳥取市     | 21   | 現年   | 建築住宅課      | 鳥取市河原町国英地区活性化施設新築(建築)工事    | 鳥取市河原町山手ほか  |                |      |      |      |        |      |     |                          |       |      |              |      |      | 1      |       | 394 |     | 394   |                               |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 22   | 現年   | 建築住宅課      | 鳥取市河原町国英地区活性化施設新築(機械)工事    | 鳥取市河原町山手ほか  | 民間             | A,B  | 62   |      |        |      | 62  |                          |       |      |              |      |      |        |       |     |     |       |                               |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 23   | 現年   | 建築住宅課      | 豊実分団消防格納庫改築(建築)工事          | 鳥取市野阪       | 民間             | A,C  |      | 56   |        |      | 56  |                          |       |      |              |      |      |        |       |     |     |       |                               |  |     |  |  |
| 鳥取市     | 24   | 現年   | 建築住宅課      | 豊実分団消防格納庫改築(機械)工事          | 鳥取市野阪       | 民間             | A,C  |      | 15   |        |      | 15  |                          |       |      |              |      |      |        |       |     |     |       |                               |  |     |  |  |











令和3年度以降の建設発生土量 調査票【東部・八頭管内】

鳥取県土整備事務所管内(直轄を除く) (単位:m3)

| 機関名        | 整理番号 | 予算区分 | 課名    | 工事名                           | 工事場所           | 建設発生土(土量、発生時期) |      |        |        |        |       |        |    | 不足土(土量、発生時期) |        |        |      |      |        |       |     |       |      |      |   |
|------------|------|------|-------|-------------------------------|----------------|----------------|------|--------|--------|--------|-------|--------|----|--------------|--------|--------|------|------|--------|-------|-----|-------|------|------|---|
|            |      |      |       |                               |                | 処分先            | 土質区分 | 4~6月   | 7~9月   | 10~12月 | 1~3月  | 計      | 備考 | R4想定         | R5想定   | 土質区分   | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月  | 計   | 備考    | R4想定 | R5想定 |   |
| 八頭県土整備事務所  | 28   | 明許   | 維持管理課 | 八東川樹木伐採・河道掘削等緊急対策工事(1工区)(国補正) | 八頭町米岡          | 民間             | B    | 3,000  | 3,000  |        |       | 6,000  |    |              |        |        |      |      |        |       |     |       |      |      |   |
| 八頭県土整備事務所  | 29   | 明許   | 維持管理課 | 八東川樹木伐採・河道掘削等緊急対策工事(2工区)(国補正) | 八頭町米岡          | 民間             | B    | 3,000  | 3,000  |        |       | 6,000  |    |              |        |        |      |      |        |       |     |       |      |      |   |
| 八頭県土整備事務所  | 30   | 明許   | 維持管理課 | 八東川樹木伐採・河道掘削等緊急対策工事(3工区)(国補正) | 八頭町花           | 民間             | A    | 3,000  | 3,000  |        |       | 6,000  |    |              |        |        |      |      |        |       |     |       |      |      |   |
| 八頭県土整備事務所  | 31   | 明許   | 維持管理課 | 八東川樹木伐採・河道掘削等緊急対策工事(4工区)(国補正) | 八頭町才代          | 民間             | A    | 3,000  | 3,000  |        |       | 6,000  |    |              |        |        |      |      |        |       |     |       |      |      |   |
| 八頭県土整備事務所  | 32   | 現年   | 維持管理課 | 千代川樹木伐採・河道掘削等緊急対策工事           | 智頭町智頭          | 民間             | A    |        |        | 2,000  | 2,000 | 4,000  |    |              |        |        |      |      |        |       |     |       |      |      |   |
| 八頭県土整備事務所  | 33   | 現年   | 維持管理課 | 大江川外樹木伐採・河道掘削等緊急対策工事          | 八頭町坂田～殿、隼郡家、見槻 | 民間             | A    |        |        | 500    | 500   | 1,000  |    |              |        |        |      |      |        |       |     |       |      |      |   |
| 八頭県土整備事務所  | 34   | 現年   | 維持管理課 | 八東川外樹木伐採・河道掘削等緊急対策工事          | 八頭町用品、新興寺      | 民間             | A    |        | 1,000  | 1,000  | 1,000 | 3,000  |    |              |        |        |      |      |        |       |     |       |      |      |   |
| 八頭県土整備事務所  | 35   | 現年   | 維持管理課 | 私都川樹木伐採・河道掘削等緊急対策工事           | 八頭町市場、上峰寺      | 民間             | A    |        |        | 3,000  |       | 3,000  |    |              |        |        |      |      |        |       |     |       |      |      |   |
| <b>総 計</b> |      |      |       |                               |                |                |      | 23,540 | 16,480 | 9,800  | 3,500 | 53,320 |    |              | 16,950 | 11,770 |      | 500  | 610    | 3,000 | 500 | 4,610 |      | -    | - |
| <b>差 引</b> |      |      |       |                               |                |                |      | 23,040 | 15,870 | 6,800  | 3,000 | 48,710 |    |              | 16,950 | 11,770 |      |      |        |       |     |       |      |      |   |

|       |        |        |        |       |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 処分先内訳 | センター   | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      |
|       | 民間     | 23,540 | 16,480 | 9,800 | 3,500  | 53,320 |        | 16,950 | 11,770 |
|       | その他    | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      |
| 計     | 23,540 | 16,480 | 9,800  | 3,500 | 53,320 |        | 16,950 | 11,770 |        |



建設発生土受入状況について

R3. 3. 10


(公財) 鳥取県建設技術センター

1 概要

公共工事の建設発生土の処理については、鳥取県と建設技術センターが協働で業務を行っており、大型事業の動向や残土発生状況を勘案しながら、計画的な新規事業所の開設を進め、安定的な受入地の確保により公共工事の推進に寄与していきます。

- 東部地区
  - ・鳥取市南部及び八頭郡内の受入を目的に、美成候補地（鳥取市用瀬町）を令和4年度中の受入を目指し開所準備を進めていきます。
- 中部地区
  - ・帽子取第2事業所（琴浦町）を令和元年2月に開所し受入を開始しましたが、令和5年度には完了する見込みであり、次期候補地を選定していきます。
- 西部地区
  - ・西部地区の大型事業からの受入を目的に、小町候補地（伯耆町）の令和3年度秋頃の開所を目指し受入準備を進めています。また、日野管内においては小原事業所を開所し、鍵掛道路事業トンネル工事等の建設発生土を本格的に受入します。

2 事業所位置

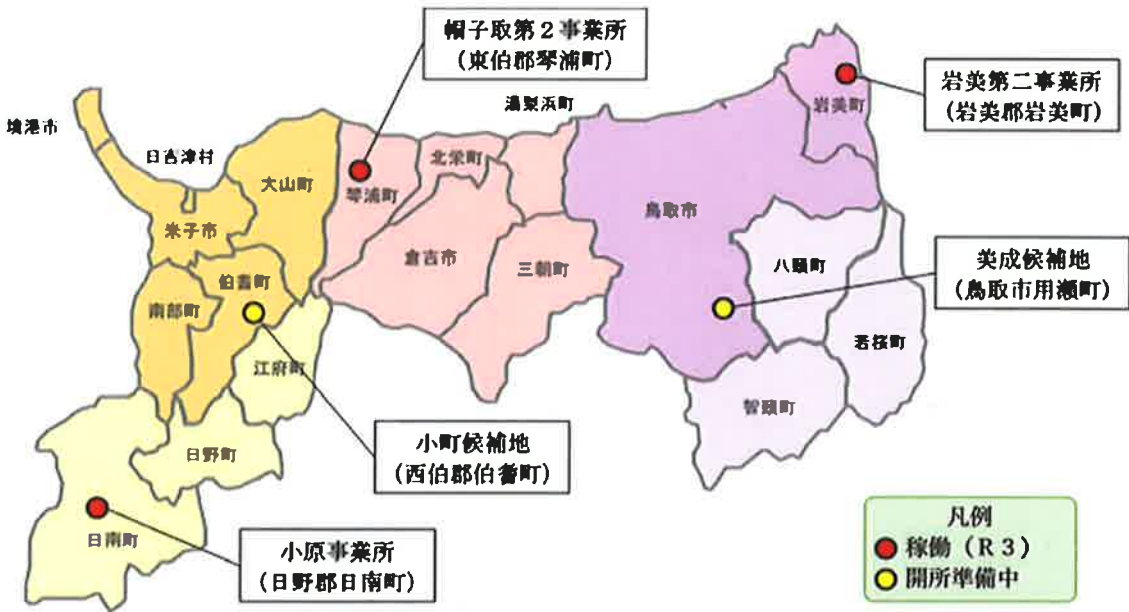

3 稼働している事業所の受入土量

R3. 1 月末時点

| 事業所名  | 所在地   | 全体受入土量<br>(m3) | 受入土量<br>(m3) | 進捗率<br>(%) | 備考      |
|-------|-------|----------------|--------------|------------|---------|
| 岩美第2  | 岩美町宇治 | 250,000        | 164,000      | 65         | 岩美道路専用  |
| 帽子取第2 | 琴浦町八橋 | 455,000        | 83,000       | 18         |         |
| 小原    | 日南町小原 | 210,000        | 12,000       | 5          | 鍵掛峠道路専用 |
| 計     |       | 915,000        | 259,000      |            |         |




### 東部管内 残土処分場 処分状況

単位:m3

| 事業者名<br>位置       | 建設技術センター(第2三谷)<br>鳥取市河原町三谷 | 大谷組       |           | 中央建設   |          | NaturalMaterial |           | アズマロジ |  | やまこう建設 |  | 合計 | 備考 |
|------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------------|-----------|-------|--|--------|--|----|----|
|                  |                            | 鳥取市長谷     | 鳥取市有富     | 鳥取市有富  | 鳥取市福部町湯山 | 鳥取市用瀬町安蔵        | 鳥取市福部町湯山  | 鳥取市南限 |  |        |  |    |    |
| 容量               | 915,000                    | 1,330,774 | 3,404,897 | 72,288 | 4,140    | 1,310           | 5,728,409 |       |  |        |  |    |    |
| H27年度            | 198,341                    |           | 311,307   |        |          |                 | 509,648   |       |  |        |  |    |    |
| H28年度            | 151,036                    | 37,459    | 275,360   |        |          |                 | 463,855   |       |  |        |  |    |    |
| H29年度            | 83,457                     | 139,522   | 80,331    |        |          |                 | 303,310   |       |  |        |  |    |    |
| H30年度            | 受入はH29完了                   | 183,713   | 77,419    |        |          |                 | 261,132   |       |  |        |  |    |    |
| R1年度             |                            | 403,893   | 126,328   | 4,414  |          |                 | 534,635   |       |  |        |  |    |    |
| R2年度(1月末まで)      |                            | 184,942   | 62,702    | 25,180 | 961      | 0               | 273,785   |       |  |        |  |    |    |
| 計                | 432,834                    | 949,529   | 933,447   | 29,594 | 961      | 0               | 2,346,365 |       |  |        |  |    |    |
| H27~R1年間平均(R2除く) | 144,278                    | 191,147   | 174,149   | 4,414  | 0        | 0               | 414,516   |       |  |        |  |    |    |
| R2年度2月以降処分可能量    |                            | 381,245   | 2,471,450 | 42,694 | 3,179    | 1,310           | 2,899,878 |       |  |        |  |    |    |

※R3.1.31までを集計

残土処分量の推移

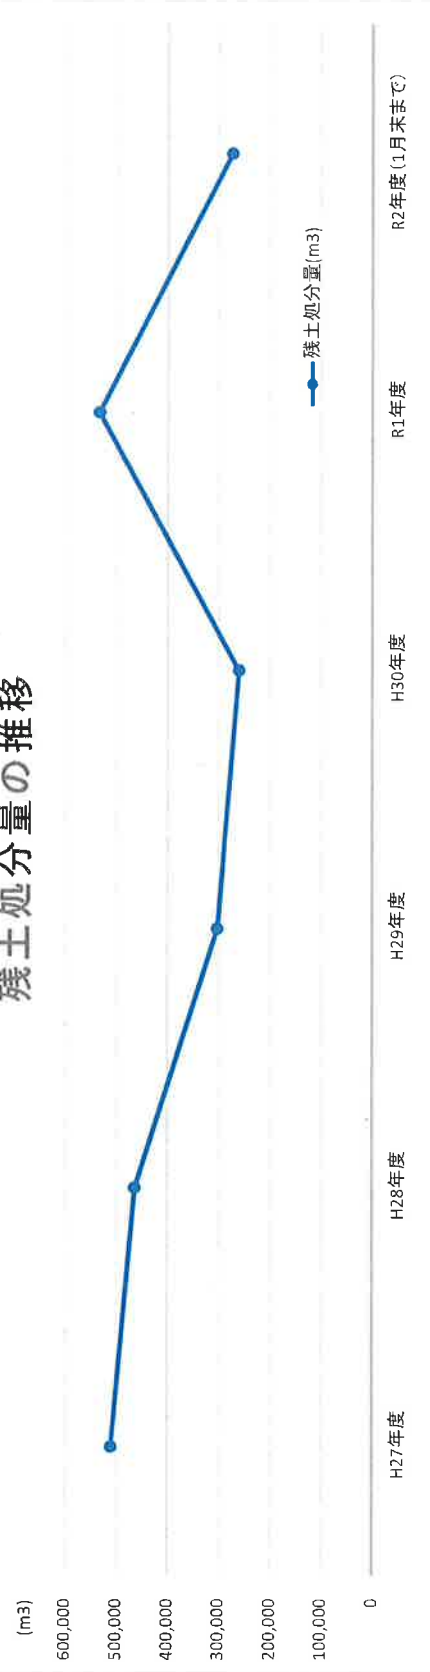



## 建設発生土受入希望地

## 事業名

史跡青谷上寺地遺跡整備事業(文化庁補助事業)

## 事業位置

鳥取市青谷町青谷～青谷町吉川(県道依原青谷線青谷インター交差点から約750m)

## 事業概要

史跡公園整備のため田地約8haを0.5m程度造成

## 受入希望土質

砂質土、礫質土、シルト粘性土

\* 高含水比のもの、転石・木根・瓦礫・塵芥を含むものは除く。

## 受入希望期間及び土量

令和3年6月～12月、令和4年6月～9月、約3,000m<sup>3</sup>/月

## その他

10tダンプ進入可

工事用道路300mをR2年度設置済、引き続きR3年度上半期に1300m設置予定

## 窓 口

鳥取県地域づくり推進部文化財局

青谷上寺地遺跡整備室(鳥取市青谷町総合支所2階)

電話 0857(85)5011

FAX 0857(85)5012

担当者 土木技師 内田 徹 uchidato@pref.tottori.lg.jp



## 鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領

## 3 建設副産物の利用（再資源化）の促進

建設副産物の利用及び再生資材としての利用促進を図ることについては、以下のとおりとする。

## (1) 対象副産物及び対象工事

本実施要領は、土砂、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の指定副産物を対象とし、県土整備部（各総合事務所県土整備局を含む。）が発注する全ての公共工事を対象とするものとする。

## (2) 土砂

ア 当該工事現場内の盛土等に利用する。

イ アにより利用できない建設発生土については、当該工事現場から 50km の範囲内に建設発生土を利用することができる他の公共工事があり、受入れ時期、土質等の調整が可能な場合は、その現場又は発注者が指定する仮置き（保管）場へ搬出し利用する。

ウ ア又はイにより利用できない建設発生土については、当該工事現場から 50km 以内にある公益財団法人鳥取県建設技術センターの事業所又は受入れ可能な地方公共団体等が運営する残土処分場（以下「事業所等」という。）、民間受入地（民間残土受入地の登録申請及び審査要領（平成 17 年 3 月 30 日第 200400026086 号県土整備部部長通知）2 の規定により登録した民間受入地をいう。）及び土質改良プラントの中で運搬費及び処分費に要するコストが最も安価となる所へ搬出する。

ただし、大規模事業で専用の事業所等を設置する場合、又は建設発生土対策協議会において搬出先の調整を行った場合には、前記によらず搬出先を指定することができる。

なお、地方公共団体等が運営する残土処分場とは、地方公共団体又は地方公共団体が委託した土地開発公社が運営する残土処分場をいい、地方公共団体等が運営する残土処分場への処分費については技術企画課と協議の上、決定する。
