

数量計算書

(起 工)

工事名：小原事業所造成工事（その4）

工事箇所：日野郡 日南町 霞

造 成 工

【造成工】数量集計表


工種	種別	細別	規格	単位	契約数量	摘要
造成工						
	路体盛土工					
		路体盛土		m3	17,000	
	法面整形工					
		盛土法面整形		m2	950	

路 体 盛 土 工

土 量 計 算 書

測点	短距離	断面積	平均断面積	立積
		0.000		
A断面	80.00	120.757	60.379	4830.280
B断面	9.75	117.070	118.914	1159.407
C断面	11.65	117.863	117.467	1368.485
D断面	20.85	116.121	116.992	2439.283
E断面	15.15	45.742	80.932	1226.112
F断面	10.45	45.852	45.797	478.579
G断面	12.90	50.185	48.019	619.439
H断面	45.20	49.878	50.032	2261.424
I断面	14.35	46.684	48.281	692.832
	83.00		23.342	1937.386
合計)				17013.226

計画平面図 (完成時)

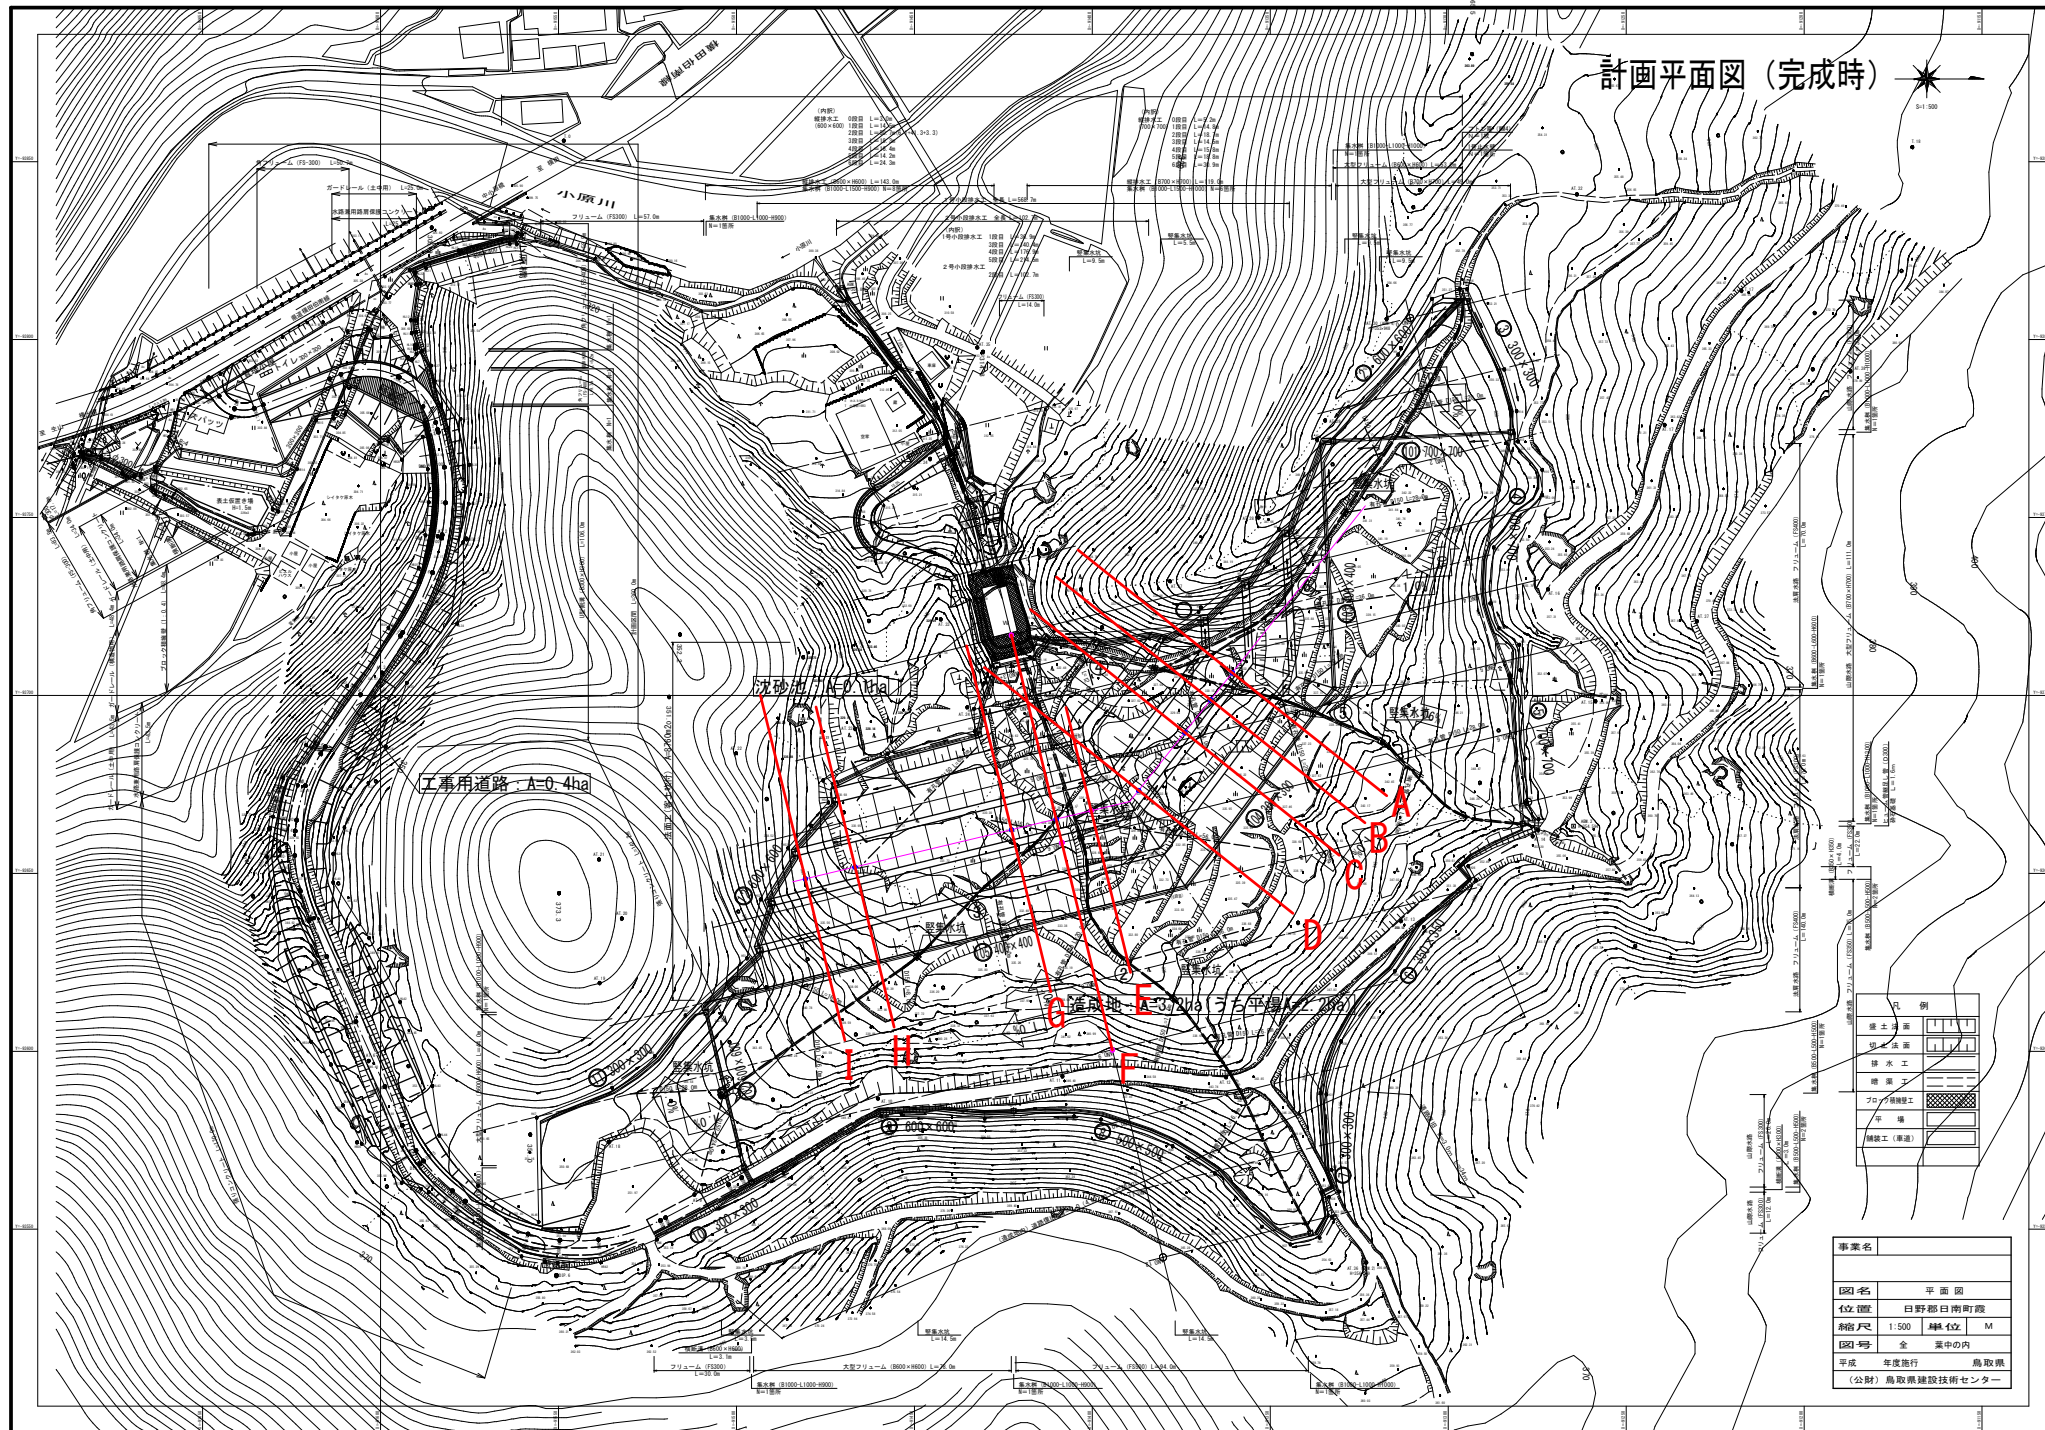




工事用道路 A=0.4ha

凡例

竣工予定	[Symbol]
竣工済	[Symbol]
排水工	[Symbol]
橋梁	[Symbol]
プロダクト施設	[Symbol]
平地	[Symbol]
舗装工(車道)	[Symbol]

事業名	
図名	平面図
位置	日野郡日南町霞
縮尺	1:500 単位 M
図号	全 案中の内
平成	年度発行 鳥取県
(公財) 鳥取県建設技術センター	

横断図 (1/200)






当初




施工済み




横断図 (1/200)




DL=330.000




横断図 (1/200)



DL=330.000



工 形 整 面 法

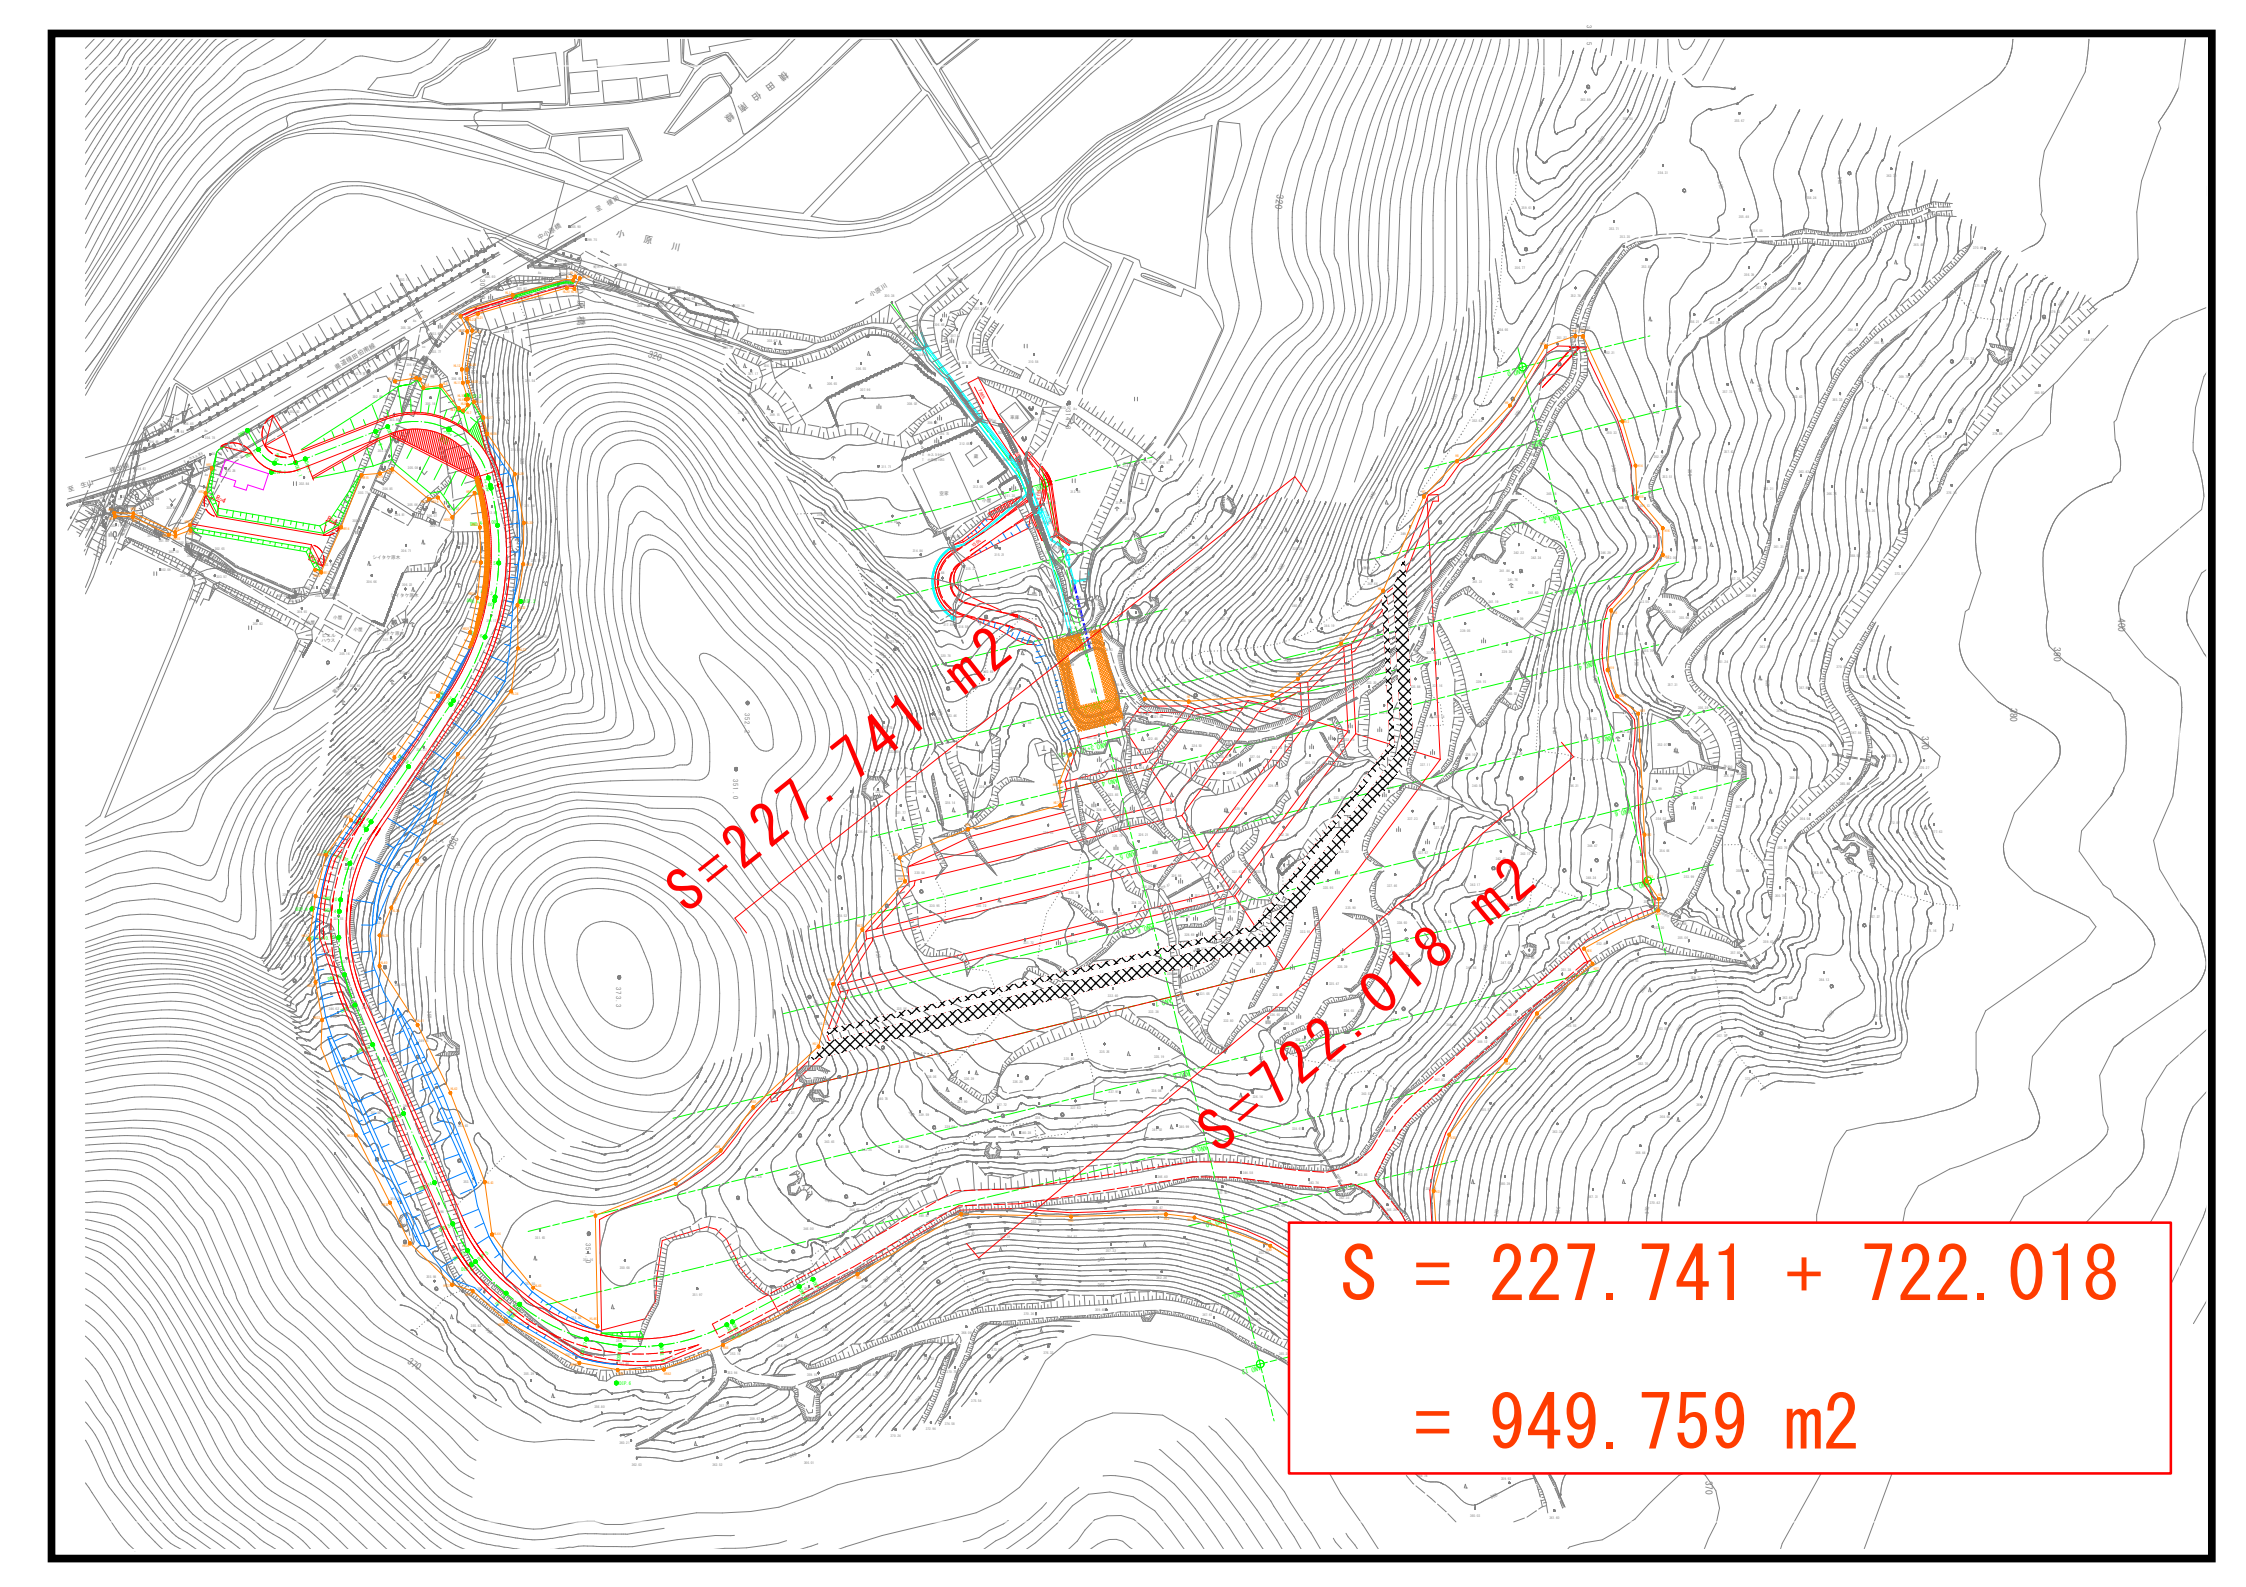

$S = 227.741 \text{ m}^2$

$S = 722.018 \text{ m}^2$

$$S = 227.741 + 722.018 \\ = 949.759 \text{ m}^2$$

仮 設 工

令和6年4月

		散水 (h)	誘導員 (人/日)
1日	(月)		
2日	(火)		
3日	(水)		
4日	(木)		
5日	(金)		
6日	(土)		
7日	(日)		
8日	(月)		
9日	(火)		
10日	(水)		1
11日	(木)		1
12日	(金)	2	1
13日	(土)		
14日	(日)		
15日	(月)	2	1
16日	(火)		1
17日	(水)		1
18日	(木)		1
19日	(金)	2	1
20日	(土)		
21日	(日)		
22日	(月)	2	1
23日	(火)		1
24日	(水)		1
25日	(木)		1
26日	(金)	2	1
27日	(土)		
28日	(日)		
29日	(月)		
30日	(火)		
計)		10	13

令和6年5月

		散水 (h)	誘導員 (人/日)
1日	(水)		
2日	(木)		
3日	(金)		
4日	(土)		
5日	(日)		
6日	(月)		
7日	(火)	2	1
8日	(水)		1
9日	(木)		1
10日	(金)	2	1
11日	(土)		
12日	(日)		
13日	(月)	2	1
14日	(火)		1
15日	(水)		1
16日	(木)		1
17日	(金)	2	1
18日	(土)		
19日	(日)		
20日	(月)	2	1
21日	(火)		1
22日	(水)		1
23日	(木)		1
24日	(金)	2	1
25日	(土)		
26日	(日)		
27日	(月)	2	1
28日	(火)		1
29日	(水)		1
30日	(木)		1
31日	(金)	2	1
計)		16	19

令和6年6月

		散水 (h)	誘導員 (人/日)
1日	(土)		
2日	(日)		
3日	(月)	2	1
4日	(火)		1
5日	(水)		1
6日	(木)		1
7日	(金)	2	1
8日	(土)		
9日	(日)		
10日	(月)	2	1
11日	(火)		1
12日	(水)		1
13日	(木)		1
14日	(金)	2	1
15日	(土)		
16日	(日)		
17日	(月)	2	1
18日	(火)		1
19日	(水)		1
20日	(木)		1
21日	(金)	2	1
22日	(土)		
23日	(日)		
24日	(月)	2	1
25日	(火)		1
26日	(水)		1
27日	(木)		1
28日	(金)	2	1
29日	(土)		
30日	(日)		
計)		16	20

	散水 (h)	誘導員 (人/日)	摘要
4月	10	13	見込
5月	16	19	見込
6月	16	20	見込
計)	42 h	52 人	見込
